GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS S/A.
Rua do Campo - 80
Vale do Sereno - Nova Lima - MG - Brasil
Tel / Fax: 55-31-2104-7171
georadar@georadar.com.br / www.georadar.com.br

PROJETO PLANGÁS


PERFIL LITOLÓGICO E CONSTRUTIVO

Estado: ES
Município: Aracruz
Nome: PL-PM-01

Latitude: 19°50'24"
Longitude: 46°04'01"
Hemisfério: S

UTM N: 7.805.866,15
UTM E: 388.276,97
Meridiano: 45

COTA:9,45

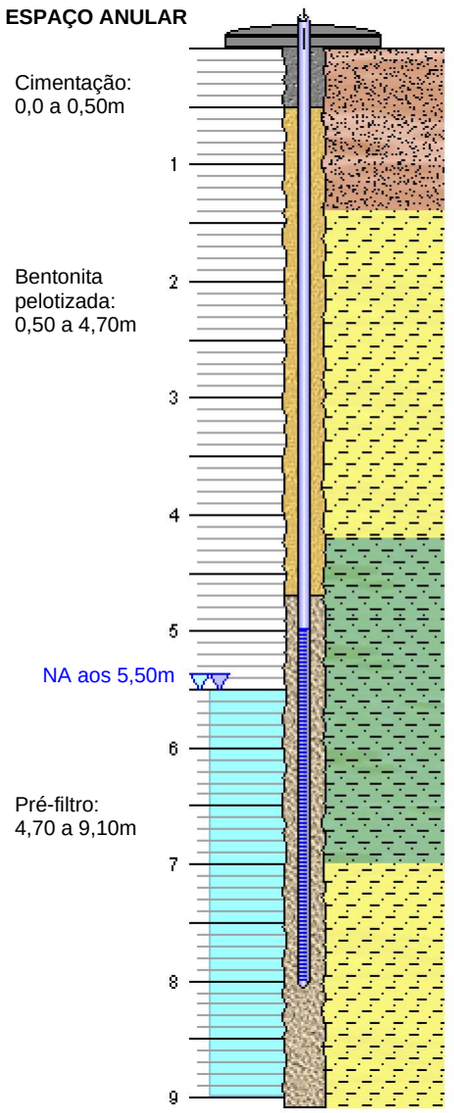

0,0 a 1,40m: Solo, Arg-ar, areia F-G, marrom claro

1,40 a 4,20m: Sed, Ar-arg, areia MF-MG, variegado a vermelho, pedreg mm a cm (concreções ferruginosas)

4,20 a 4,90m: Sed, Arg-ar, areia MF-MG, vermelho, pedreg mm a cm (concreções ferruginosas)

4,90 a 7,0m: Sed, Arg-ar, areia F-MG, róseo, pedreg mm, úmido

7,0 a 9,10m: Sed, Ar-arg, areia F-MG, róseo, úmido

Revestimento/Filtro: Tubo liso (diâmetro 2"): 0,0 a 5,0m
Tubo ranhurado (diâmetro 2"): 5,0 a 8,0m

Diâmetro da perfuração (pol.): 06"

Profundidade final: 9,10m

LEGENDA:

At: aterro	Ar-arg: areno-argiloso
Sed: sedimento	Arg: argiloso
Ar: arenoso	MO: matéria orgânica
Arg-ar: argilo-arenoso	Areia F-M-G: fina, média, grossa
