GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS S/A.

Rua do Campo - 80
Vale do Sereno - Nova Lima - MG - Brasil
Tel / Fax: 55-31-2104-7171
georadar@georadar.com.br / www.georadar.com.br

PROJETO PLANGÁS


PERFIL LITOLÓGICO E CONSTRUTIVO

Estado: ES
Município: Aracruz
Nome: PL-PM-15

Latitude: 19°50'28"
Longitude: 46°03'43"
Hemisfério: S

UTM N: 7.805.748,54
UTM E: 388.796,30
Meridiano: 45

COTA:4,20

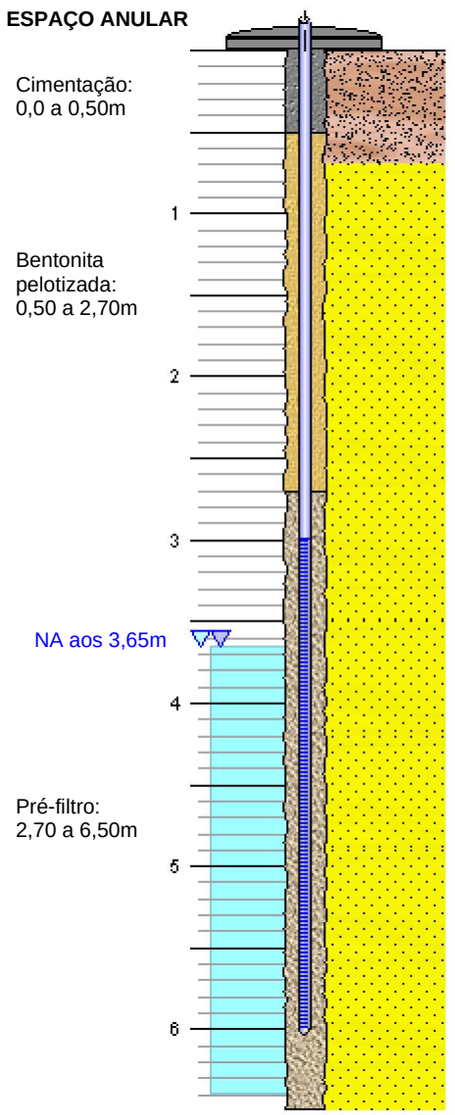

0,0 a 0,70m: Solo, Ar, areia MF-MG, pouco argiloso, marrom claro, MO

0,70 a 3,50m: Sed, Ar, areia F-MG, marrom claro, pedreg mm

3,50 a 4,20m: Sed, Ar, areia MF-MG, marrom claro

4,20 a 4,90m: Sed, Ar, areia MF-MG, marrom claro, pedreg mm a cm

4,90 a 6,50m: Sed, Ar, areia MF-MG, bege escuro, pedreg mm a cm, fragmentos de conchas do mar

Revestimento/Filtro: Tubo liso (diâmetro 2"): 0,0 a 3,0m
Tubo ranhurado (diâmetro 2"): 3,0 a 6,0m

Diâmetro da perfuração (pol.): 06"

Profundidade final: 6,50m

LEGENDA:

At: aterro	Ar-arg: areno-argiloso
Sed: sedimento	Arg: argiloso
Ar: arenoso	MO: matéria orgânica
Arg-ar: argilo-arenoso	Areia F-M-G: fina, média, grossa
