GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS S/A.

Rua do Campo - 80
Vale do Sereno - Nova Lima - MG - Brasil
Tel / Fax: 55-31-2104-7171
georadar@georadar.com.br / www.georadar.com.br

PROJETO PLANGÁS


PERFIL LITOLÓGICO E CONSTRUTIVO

Estado: ES
Município: Aracruz
Nome: PL-PM-19

Latitude: 19°50'27"
Longitude: 46°03'53"
Hemisfério: S

UTM N: 7.805.775,59
UTM E: 388.509,64
Meridiano: 45

COTA:10,87

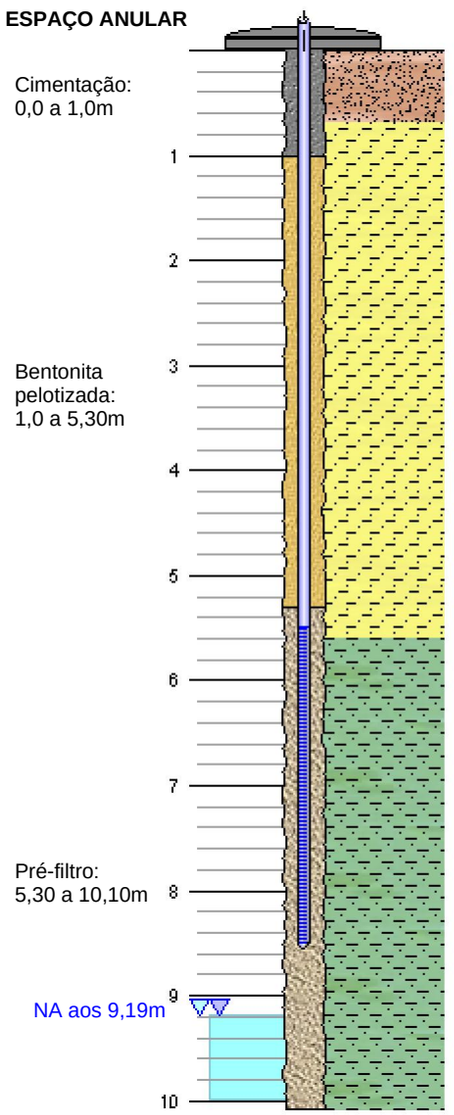

0,0 a 0,70m: Solo, Ar, areia MF-MG, pouco argiloso, marrom claro, MO

0,70 a 4,20m: Sed, Ar-arg, areia MF-G, variegado a marrom claro

4,20 a 5,60m: Sed, Ar-arg, areia MF-G, bege e rosa

5,60 a 10,10m: Sed, Arg-ar, areia MF-MG, pouco siltoso, cinza e róseo escuro

Revestimento/Filtro: Tubo liso (diâmetro 2"): 0,0 a 5,50m
Tubo ranhurado (diâmetro 2"): 5,50 a 8,50m

Diâmetro da perfuração (pol.): 06"

Profundidade final: 10,10m

LEGENDA:

At: aterro	Ar-arg: areno-argiloso
Sed: sedimento	Arg: argiloso
Ar: arenoso	MO: matéria orgânica
Arg-ar: argilo-arenoso	Areia F-M-G: fina, média, grossa
