GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS S/A.

Rua do Campo - 80
Vale do Sereno - Nova Lima - MG - Brasil
Tel / Fax: 55-31-2104-7171
georadar@georadar.com.br / www.georadar.com.br

PROJETO PLANGÁS


PERFIL LITOLÓGICO E CONSTRUTIVO

Estado: ES
Município: Aracruz
Nome: PL-PM-20

Latitude: 19°50'24"
Longitude: 46°03'48"
Hemisfério: S

UTM N: 7.805.874,72
UTM E: 388.655,82
Meridiano: 45

COTA:9,93

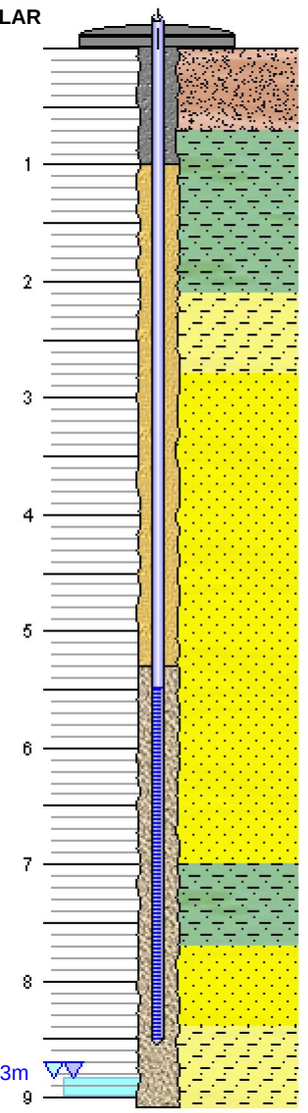

0,0 a 0,70m: Solo, Ar, areia MF-MG, marrom, pedreg mm

0,70 a 2,10m: Sed, Arg-ar, areia MF-MG, marrom, pedreg mm, MO

2,10 a 2,80m: Sed, Ar-arg, areia MF-MG, marrom, pedreg mm

2,80 a 5,60m: Sed, Ar, areia MF-MG, pouco argiloso, marrom avermelhado

5,60 a 7,0m: Sed, Ar, areia MF-MG, bege e rosa

7,0 a 7,70m: Sed, Arg-ar, areia F-G, rosa escuro e cinza, pouco úmido

7,70 a 8,40m: Sed, Ar, areia MF-MG, pouco argiloso, rosa escuro esbranquiçado

8,40 a 9,10m: Sed, Ar-arg, areia MF-MG, rosa esbranquiçado

Revestimento/Filtro: Tubo liso (diâmetro 2"): 0,0 a 5,50m
Tubo ranhurado (diâmetro 2"): 5,50 a 8,50m

Diâmetro da perfuração (pol.): 06"

Profundidade final: 9,10m

LEGENDA:

At: aterro	Ar-arg: areno-argiloso
Sed: sedimento	Arg: argiloso
Ar: arenoso	MO: matéria orgânica
Arg-ar: argilo-arenoso	Areia F-M-G: fina, média, grossa
