GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS S/A.

Rua do Campo - 80
Vale do Sereno - Nova Lima - MG - Brasil
Tel / Fax: 55-31-2104-7171
georadar@georadar.com.br / www.georadar.com.br

PROJETO PLANGÁS


PERFIL LITOLÓGICO E CONSTRUTIVO

Estado: ES
Município: Aracruz
Nome: PL-PM-21

Latitude: 19°50'23"
Longitude: 46°03'54"
Hemisfério: S

UTM N: 7.805.893,93
UTM E: 388.464,51
Meridiano: 45

COTA:7,67

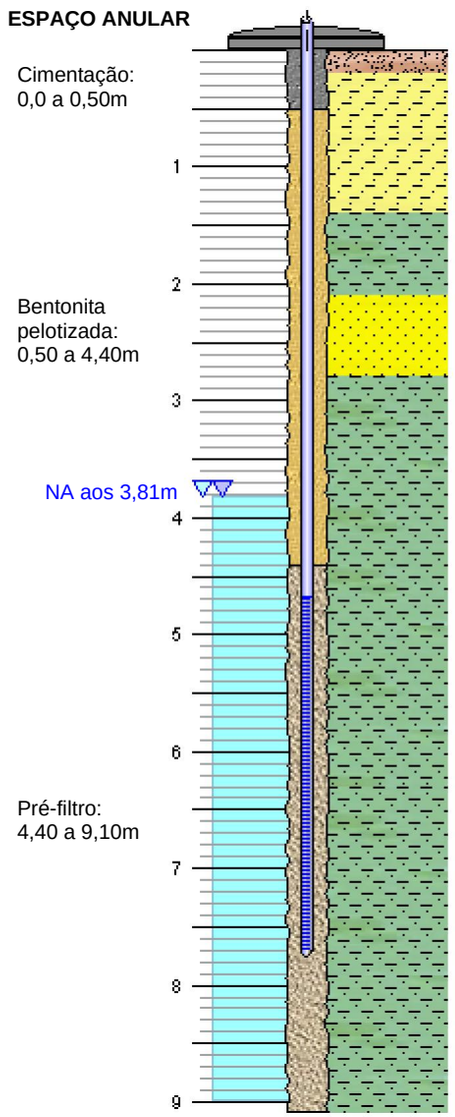

0,0 a 0,20m: Solo, Ar-arg, areia F-MG, marrom, pedreg mm a cm (concreções ferruginosas)

0,20 a 0,70m: Sed, Ar-arg, areia F-MG, castanho avermelhado

0,70 a 1,40m: Sed, Ar-arg, areia F-MG, variegado a castanho avermelhado, pedreg mm a cm (concreções ferruginosas)

1,40 a 2,10m: Sed, Arg-ar, areia F-G, variegado a vermelho escuro

2,10 a 2,80m: Sed, Ar, areia F-MG, pouco argiloso, variegado a bege médio, pedreg mm a cm (concreções ferruginosas)

2,80 a 4,20m: Sed, Arg-ar, areia F-MG, vermelho médio, pedreg mm

4,20 a 6,30m: Sed, Arg-ar, areia F-MG, vermelho médio, pedreg mm (concreções ferruginosas)

6,30 a 9,10m: Sed, Arg-ar, areia F-MG, variegado a vermelho claro e branco acinzentado, pedreg mm a cm

Revestimento/Filtro: Tubo liso (diâmetro 2"): 0,0 a 4,70m
Tubo ranhurado (diâmetro 2"): 4,70 a 7,70m

Diâmetro da perfuração (pol.): 07"

Profundidade final: 9,10m

LEGENDA:

At: aterro	Ar-arg: areno-argiloso
Sed: sedimento	Arg: argiloso
Ar: arenoso	MO: matéria orgânica
Arg-ar: argilo-arenoso	Areia F-M-G: fina, média, grossa
