GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS S/A.

Rua do Campo - 80
Vale do Sereno - Nova Lima - MG - Brasil
Tel / Fax: 55-31-2104-7171
georadar@georadar.com.br / www.georadar.com.br

PROJETO PLANGÁS ADITIVO


PERFIL LITOLÓGICO E CONSTRUTIVO

Estado: ES
Município: Aracruz
Nome: PL-PM-34

Latitude: 19°50'17"
Longitude: 46°03'57"
Hemisfério: S

UTM N: 7.806.081,69
UTM E: 388.393,53
Meridiano: 45

COTA:6,97

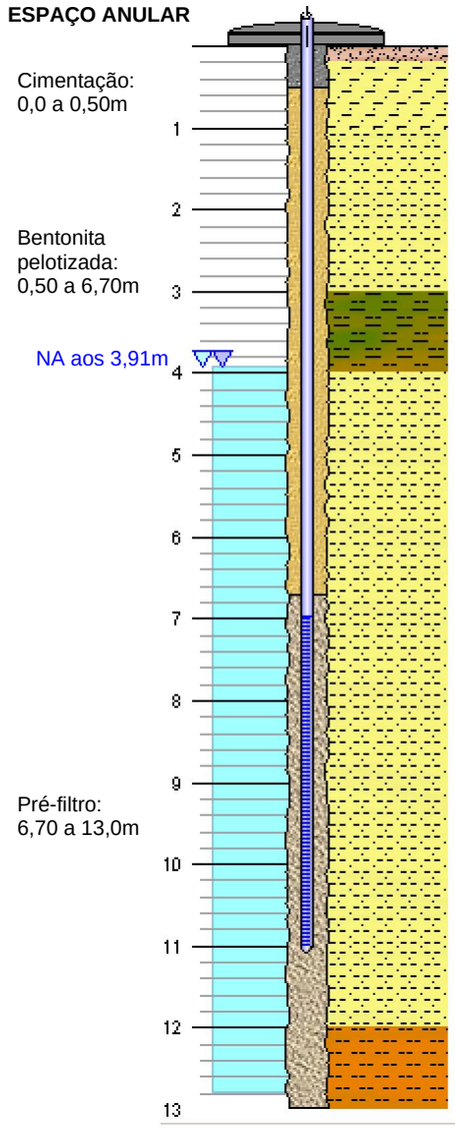

0,0 a 0,20m: Solo, Ar, areia MF-M, pouco argiloso, marrom, pedreg mm, MO

0,20 a 1,0m: Sed, Ar-arg, areia MF-MG, bege, pedreg mm

1,0 a 2,0m: Sed, Silt-ar, areia MF-MG, pouco argiloso, cinza claro, pedreg mm

2,0 a 3,0m: Sed, Silt-ar, areia MF-MG, pouco argiloso, rosa escuro e cinza, pedreg mm (concreções ferruginosas)

3,0 a 4,0m: Sed, Silt-arg, pouco arenoso, areia MF-MG, variegado a rosa, pedreg mm (concreções ferruginosas)

4,0 a 5,0m: Sed, Ar-silt, areia MF-F, rosa e cinza

5,0 a 6,0m: Sed, Silt-ar, areia MF-M, cinza e rosa, pedreg mm

6,0 a 7,0m: Sed, Silt-ar, areia MF-MG, pouco argiloso, cinza com porções rosa

7,0 a 8,0m: Sed, Ar-silt, areia MF-MG, cinza e rosa

8,0 a 11,0m: Sed, Ar-silt, areia MF-MG, rosa e cinza

11,0 a 12,0m: Sed, Silt-ar, areia MF-F, vermelho e cinza

12,0 a 13,0m: Sed, Silt, pouco arenoso e argiloso, areia MF-M, rosa escuro e cinza claro, pedreg mm (concreções ferruginosas)

Revestimento/Filtro: Tubo liso (diâmetro 2"): 0,0 a 7,0m
Tubo ranhurado (diâmetro 2"): 7,0 a 11,0m

Diâmetro da perfuração (pol.): 06"

Profundidade final: 13,0m

LEGENDA:

At: aterro	Ar-arg: areno-argiloso
Sed: sedimento	Arg: argiloso
Ar: arenoso	MO: matéria orgânica
Arg-ar: argilo-arenoso	Areia F-M-G: fina, média, grossa
